

Plan Estratégico Comarcal Debabarrena

Informe de seguimiento, abril 2026

Contenido

1_ Contexto

2_ Visión global

3_ Estado actual de ejecución

4_ Proyectos y actuaciones

5_ Proyectos y actuaciones nuevas

Contexto

Plan Estratégico Comarcal_PEC Debabarrena


Introducción

Debarrena ha experimentado en los últimos años un deterioro social y económico que justifican su inclusión en 2023 dentro de las **Zonas de Actuación Prioritaria (ZAP)** del Gobierno Vasco.

En este marco, el Gobierno Vasco, en colaboración con las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, diseña un Plan Estratégico Comarcal para la **revitalización socioeconómica** de la ZAP de Debarrena.



Fuente: Debegesa.

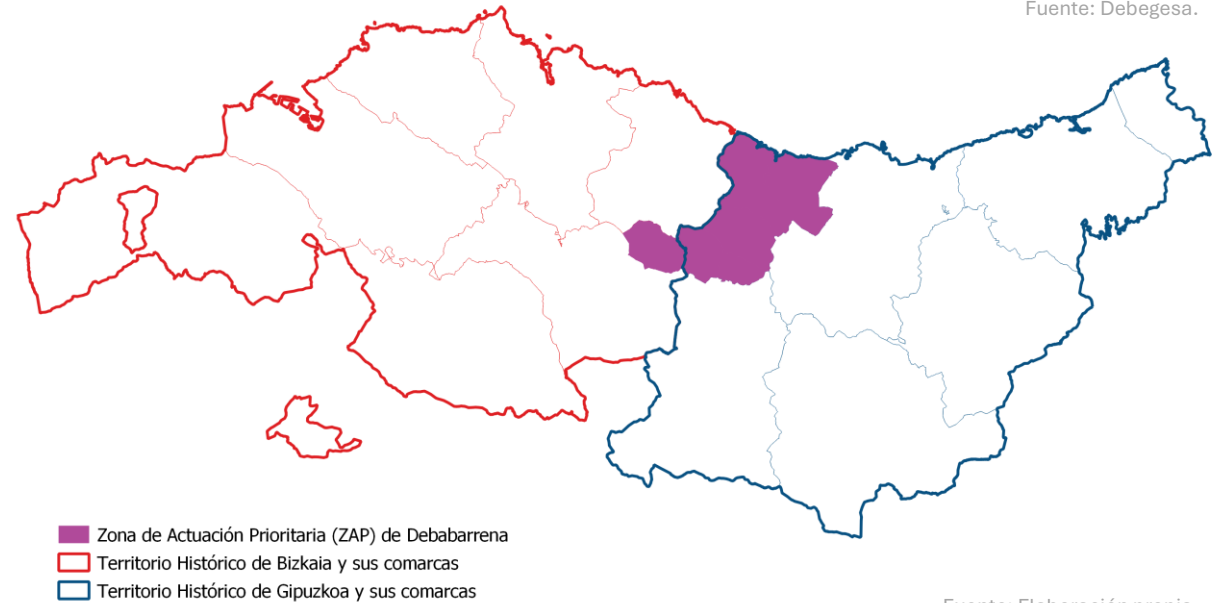

Fuente: Elaboración propia.

Objetivos


Los objetivos principales del Plan son:



Priorizar e impulsar un conjunto de **proyectos tractores y actuaciones** que contribuyan de manera decisiva a la **revitalización socioeconómica de Debabarrena**, favoreciendo la equiparación de las condiciones socioeconómicas de sus municipios integrantes con las de la media de Bizkaia, Gipuzkoa y Euskadi.



Dar respuesta a la **necesidad de impulsar el territorio**, que desde un consenso multinivel aborden los principales elementos de **revitalización socioeconómica** en el medio-largo plazo y la fortalezcan en su conjunto.



Grupo Motor




El Grupo Motor, de carácter **interinstitucional**, es fundamental para la definición, impulso y seguimiento del Plan. Está compuesto por el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa y los 8 Ayuntamientos de la **Zona de Actuación Prioritaria**.

Este informe tiene como objetivo trasladar al Grupo Motor el **estado de ejecución de los proyectos tractores y las actuaciones después del primer año de ejecución**, cumpliendo con el compromiso de seguimiento anual.

Visión global

Plan Estratégico Comarcal_PEC Debabarrena

Definición del Plan Estratégico Comarcal



Definición de los ámbitos de actuación

D1. Modernización industrial y recuperación de suelo y edificaciones industriales.	Debabarrena debe apostar por reforzar el carácter industrial de la comarca, promoviendo un entorno industrial atractivo con una estructura empresarial fuerte y cohesionada, que ponga en valor las capacidades comarcales.
D2. Diversificación económica: sector turístico y comercial.	Revitalizar el turismo es esencial para diversificar la economía de Debabarrena. Se requiere mejorar el espacio turístico, poner en valor los recursos naturales, adecuar las infraestructuras de alojamiento y garantizar servicios sostenibles y de calidad para los visitantes.
D3. Diversificación económica: sector cultural.	Apostar por una estrategia concreta en el ámbito de las industrias culturales y creativas (ICCs), resulta clave para favorecer la cohesión social y los valores y la integración sociocultural de la población. Es fundamental crear espacios de creatividad e innovación que combinen usos culturales y de ocio con actividades empresariales innovadoras
D4. Empleo y proyectos de formación profesional.	La comarca debe avanzar en la generación de polos y espacios atractivos para el talento, favoreciendo al mismo tiempo la proximidad entre el tejido empresarial y formativo a través de instrumentos como los modelos duales de formación.
D5. Regeneración urbana y protección social.	Es necesaria una regeneración urbana que reactive el municipio. Debabarrena debe avanzar de manera decidida en la regeneración sostenible e integrada de su entorno urbano, transformando la comarca en un territorio más atractivo y cohesionado que supere sus principales retos ambientales y urbanos.
D6. Medioambiente y movilidad sostenible.	La regeneración de sus recursos naturales en general, y del Río Deba en particular, como eje vertebrador de la comarca, son aspectos clave para la comarca. También debe abordarse de manera prioritaria la mejora de las conexiones de transporte público y reforzar las infraestructuras verdes.

Definición de proyectos y actuaciones

Ámbitos de actuación	Proyectos tractores y actuaciones	Estado actual	Municipio	Entidad responsable
D1. Modernización industrial y recuperación de suelo y edificaciones industriales.	1. Reacondicionamiento del Polígono Industrial de Urtia.	En ejecución	Ermua	Gobierno Vasco
	2. Reacondicionamiento del Polígono Industrial de Goitondo.	En ejecución	Mallabia	Gobierno Vasco
	3. Polígono Industrial de Mijoa.	Sin empezar	Mutriku	Gobierno Vasco
	4. Accesibilidad Polígono Industrial Azitain .	En ejecución	Eibar	Gobierno Vasco
	5. Accesibilidad Polígono Industrial Matsaria.	En ejecución	Eibar	Gobierno Vasco
	6. Accesibilidad Erisono.	En ejecución	Eibar	Gobierno Vasco
	7. Nuevo acceso hospital/polígonos.	Sin empezar	Varios	Diputación Foral de Gipuzkoa
	8. Mejora del acceso al polígono industrial de Itziar-Deba (GI-3210).	Ejecutado	Deba	Diputación Foral de Gipuzkoa
	9. Espacio de datos para PYMES industriales de Bizkaia.	En ejecución	Ermua	Diputación Foral de Bizkaia
D2. Diversificación económica: sector turístico y comercial.	1. Made in Eibar.	En ejecución	Eibar	Gobierno Vasco
	2. Plaza del mercado de Errebal.	En ejecución	Eibar	Gobierno Vasco
D3. Diversificación económica: sector cultural.	1. Equipamiento cultural con visión comarcal.	Ejecutado	Deba	Gobierno Vasco
	2. Museo de la Armería (diseño industrial).	En ejecución	Eibar	Gobierno Vasco
D4. Empleo y proyectos de formación profesional.	1. Acuicultura.	En ejecución	Mutriku	Gobierno Vasco
	2. IMH campus.	En ejecución	Elgoibar	Gobierno Vasco
	3. Armería eskola - Centro comarcal de referencia y excelencia en tecnologías robóticas e inteligentes (TReI).	En ejecución	Eibar	Gobierno Vasco
D5. Regeneración urbana y protección social.	1. Regeneración zona Olalde.	En ejecución	Soraluze	Gobierno Vasco
	2. Rehabilitación plaza del mercado de Ermua.	En ejecución	Ermua	Gobierno Vasco
	3. Recuperación de la plaza de Usetxe y reconstrucción del edificio para equipamiento cultural.	En ejecución	Elgoibar	Gobierno Vasco
	4. Edificio Larrañaga y Elorza.	En ejecución	Eibar	Gobierno Vasco
	5. Edificio Ugartetxea.	Ejecutado	Eibar	Gobierno Vasco
	6. Nuevos equipamientos servicios sociales.	En ejecución	Elgoibar	Diputación Foral de Gipuzkoa
D6. Medioambiente y movilidad sostenible.	1. Estuario de Mutriku - Deba.	Sin empezar	Mutriku y Deba	Gobierno Vasco
	2. Ascensor de Urruzuno.	En ejecución	Elgoibar	Gobierno Vasco
	3. Accesibilidad Polígono Arriaga.	En ejecución	Elgoibar	Gobierno Vasco
	4. Ascensores Barakaldo.	Ejecutado	Eibar	Gobierno Vasco
	5. Ascensor Torrekuia.	En ejecución	Eibar	Gobierno Vasco
	6. Reordenación de las intersecciones de la BI-2301 en Mallabia.	Ejecutado	Mallabia	Diputación Foral de Bizkaia
	7. Variante oeste de Ermua.	En ejecución	Ermua	Diputación Foral de Bizkaia
	8. Bidegorri conexión Gipuzkoa.	Sin empezar	Zaldibar y Ermua	Diputación Foral de Bizkaia
	9. Mejora del puente de acceso a Merando GI-3821.	Ejecutado	Mendaro	Diputación Foral de Gipuzkoa

Estado actual de ejecución

Plan Estratégico Comarcal_PEC
Debabarrena


Cuadro resumen

Presupuesto total	152.303.443,00 €	
Presupuesto ZAP previsto (2025)	142.198.011,00 €	93,36%
Presupuesto ZAP actualizado (2026)	146.535.434,10 €	+ 4.337.423, 10 €



Presupuesto ZAP actualizado	146.535.434,10 €
Ejecutado	16.096.380,47 €
Pendiente	130.439.053,63 €


Estado de proyectos y actuaciones	31
Ejecutado	6
En ejecución	21
Sin empezar	4

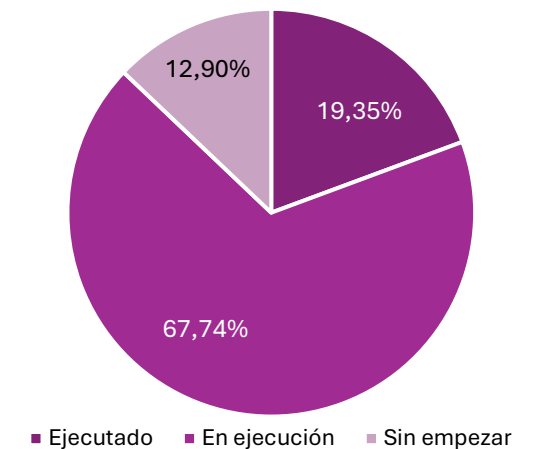

Distribución del presupuesto por ámbitos

	Total Presupuesto	ZAP Presupuesto previsto
D1. Modernización industrial y recuperación de suelo y edificaciones industriales.	18.444.368,00 €	16.659.368,00 €
D2. Diversificación económica: sector turístico y comercial.	2.063.000,00 €	2.063.000,00 €
D3. Diversificación económica: sector cultural.	10.062.000,00 €	3.812.000,00 €
D4. Empleo y proyectos de formación profesional.	2.037.500,00 €	1.862.500,00 €
D5. Regeneración urbana y protección social.	34.102.514,00 €	31.502.514,00 €
D6. Medioambiente y movilidad sostenible.	86.302.929,00 €	86.298.629,00 €
TOTAL, PEC DEBABARRENA	152.303.443,00 €	142.198.011,00 €


Distribución del presupuesto ZAP previsto (%)

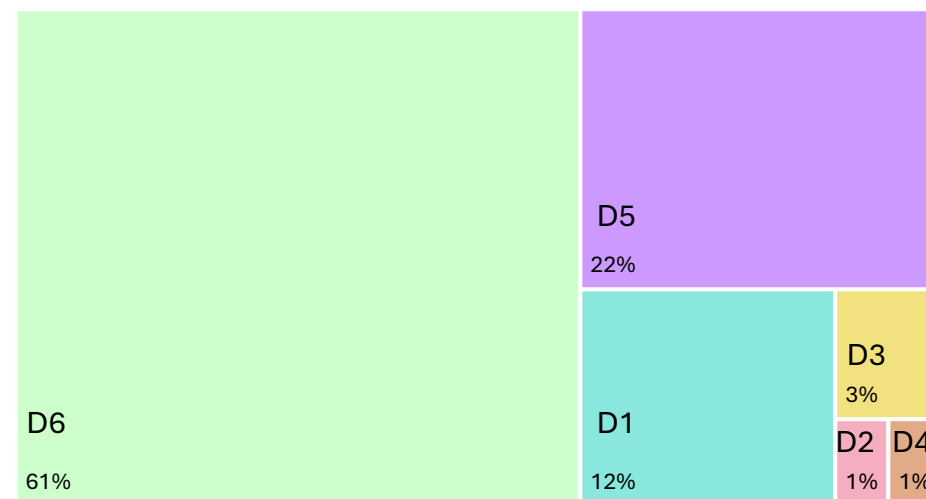

Estado de ejecución del presupuesto

	Presupuesto ZAP			
	Previsto (2025)	Actualizado (2026)		
	Total	Total	Ejecutado	Pendiente
D1. Modernización industrial y recuperación de suelo y edificaciones industriales.	16.659.368,00 €	19.083.366,00 €	2.650.468,00 €	16.432.898,00 €
D2. Diversificación económica: sector turístico y comercial.	2.063.000,00 €	2.063.000,00 €	0,00 €	2.063.000,00 €
D3. Diversificación económica: sector cultural.	3.812.000,00 €	3.812.000,00 €	1.062.000,00 €	2.750.000,00 €
D4. Empleo y proyectos de formación profesional.	1.862.500,00 €	1.862.500,00 €	46.839,75 €	1.815.660,25 €
D5. Regeneración urbana y protección social.	31.502.514,00 €	31.486.043,25 €	1.544.279,25 €	29.941.764,00 €
D6. Medioambiente y movilidad sostenible.	86.298.629,00 €	88.228.524,85 €	10.792.793,47 €	77.435.731,38 €
TOTAL, PEC DEBABARRENA	142.198.011,00 €	146.535.434,10 €	16.096.380,47 €	130.439.053,63 €

Grado de ejecución del presupuesto ZAP actualizado

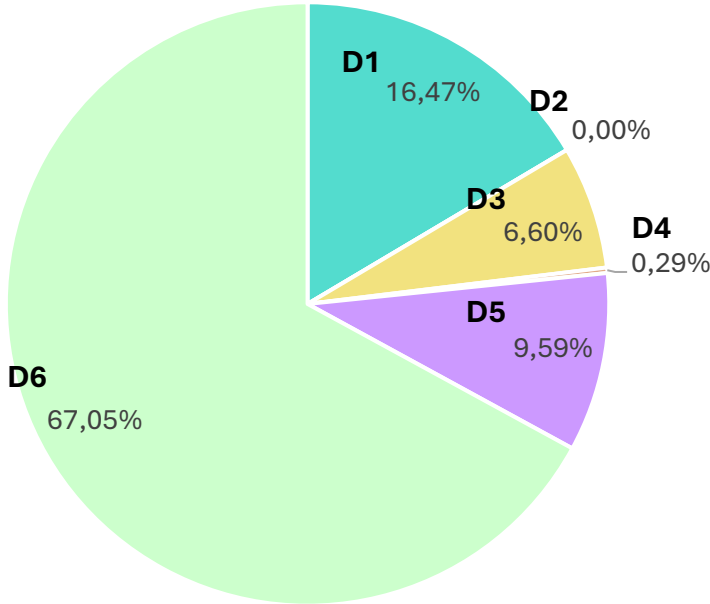

Proyectos y actuaciones


Plan Estratégico Comarcal_PEC
Debabarrena

D1.

MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL Y RECUPERACIÓN DE SUELO Y EDIFICACIONES INDUSTRIALES.

Descripción de los avances

D1. MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL Y RECUPERACIÓN DE SUELO Y EDIFICACIONES INDUSTRIALES



Proyectos y actuaciones		Presupuesto ZAP					
		Previsto	Actualizado	Ejecutado		Pendiente	
1	Reacondicionamiento del Polígono Industrial de Urtia.	175.000,00 €	175.000,00 €	23.100,00 €	13,20 %	151.900,00 €	86,80 %
2	Reacondicionamiento del Polígono Industrial de Goitondo.	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 %	350.000,00 €	100,00 %
3	Polígono Industrial de Mijoa.	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 %	140.000,00 €	100,00 %
4	Accesibilidad Polígono Industrial Azitain .	910.000,00 €	910.000,00 €	0,00 €	0,00 %	910.000,00 €	100,00 %
5	Accesibilidad Polígono Industrial Matsaria.	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	255.000,00 €	14,57 %	1.495.000,00 €	85,43 %
6	Accesibilidad Erisono.	840.000,00 €	840.000,00 €	0,00 €	0,00 %	840.000,00 €	100,00 %
7	Nuevo acceso hospital/polígonos.	10.000.000,00 €	12.423.998,00 €	0,00 €	0,00 %	12.423.998,00 €	100,00 %
8	Mejora del acceso al polígono industrial de Itziar-Deba (GI-3210).	2.026.868,00 €	2.026.868,00 €	2.026.868,00 €	100,00 %	0,00 €	0,00 %
9	Espacio de datos para PYMES industriales de Bizkaia.	467.500,00 €	467.500,00 €	345.500,00 €	73,90 %	122.000,00 €	26,10 %
TOTAL		16.659.368,00 €	19.083.366,00 €	2.650.468,00 €	13,89 %	16.432.998,00 €	86,11 %

Actuación 1. Reacondicionamiento del Polígono Industrial de Urtía

D1. Modernización industrial y recuperación de suelo y edificaciones industriales

Ubicación	Ermua	Entidad responsable	Gobierno Vasco	Plazo temporal	2025-2026	Estado	En ejecución
-----------	-------	---------------------	----------------	----------------	-----------	--------	--------------

Descripción	Objetivos e impacto esperado
Reacondicionamiento del polígono mediante acciones de urbanización, mejora de la iluminación y otras.	Atraer nueva actividad empresarial.

Presupuesto de la actuación	
Importe total	250.000,00 €
Importe ZAP	175.000,00 €

Presupuesto ZAP	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	175.000,00 €	175.000,00 €	23.100,00 €	151.900,00 €
Diputación Foral de Bizkaia	-	12.000,00 €	12.000,00 €	-
Total	175.000,00 €	187.000,00 €	45.100,00 €	151.900,00 €

Descripción de los avances
Se ha ejecutado y justificado correctamente el presupuesto previsto para 2025 por parte del Gobierno Vasco.
Asimismo, la Asociación de empresas del polígono de Urtía de Ermua ha elaborado el Plan de Gestión y mejora del propio polígono, con apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia.

Actuación 2. Reacondicionamiento del Polígono Industrial de Goitondo

D1. Modernización industrial y recuperación de suelo y edificaciones industriales

Ubicación Mallabia **Entidad responsable** Gobierno Vasco **Plazo temporal** 2026-2026 **Estado** En ejecución

Descripción	Objetivos e impacto esperado
Reacondicionamiento del polígono mediante acciones de urbanización, mejora de la iluminación y otras.	Atraer nueva actividad empresarial.

Presupuesto de la actuación	
Importe total	500.000,00 €
Importe ZAP	350.000,00 €

Presupuesto ZAP				
	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €

Descripción de los avances
La actuación se encuentra en ejecución, con la dotación prevista en el ejercicio 2026 según la planificación presupuestaria.

Actuación 3. Polígono Industrial de Mijoa

D1. Modernización industrial y recuperación de suelo y edificaciones industriales

Ubicación Mutriku **Entidad responsable** Gobierno Vasco **Plazo temporal** 2026-2029 **Estado** Sin empezar

Descripción **Objetivos e impacto esperado**

Mijoa Fase III y otros. Atraer nueva actividad empresarial.

Presupuesto de la actuación

Importe total	200.000,00 €
Importe ZAP	140.000,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €

Descripción de los avances

La planificación presupuestaria se ha ajustado para redistribuir la dotación prevista y facilitar su ejecución durante el periodo restante.

Actuación 4. Accesibilidad Polígono Industrial de Azitain

D1. Modernización industrial y recuperación de suelo y edificaciones industriales

Ubicación Eibar **Entidad responsable** Gobierno Vasco **Plazo temporal** 2026-2027 **Estado** En ejecución

Descripción

Acciones de mejora del acceso rodado ante la dificultad de giro de camiones.

Objetivos e impacto esperado

Mejorar la accesibilidad y funcionalidad del acceso rodado para facilitar las maniobras de giro de vehículos pesados, especialmente de camiones.

Presupuesto de la actuación

Importe total	1.250.000,00 €
Importe ZAP	910.000,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	910.000,00 €	910.000,00 €	0,00 €	910.000,00 €

Descripción de los avances

La actuación se encuentra en ejecución, con la dotación prevista en el ejercicio 2026 según la planificación presupuestaria.

Actuación 5. Accesibilidad Polígono Industrial de Matsaria

D1. Modernización industrial y recuperación de suelo y edificaciones industriales

Ubicación Eibar **Entidad responsable** Gobierno Vasco **Plazo temporal** 2025-2028 **Estado** En ejecución

Descripción	Objetivos e impacto esperado
Mejora del acceso rodado ante la dificultad de giro de camiones.	Atraer nueva actividad empresarial.

Presupuesto de la actuación	
Importe total	2.500.000,00 €
Importe ZAP	1.750.000,00 €

Presupuesto ZAP				
	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	255.000,00 €	1.495.000,00 €

Descripción de los avances

Se ha ejecutado y justificado correctamente el presupuesto previsto para 2025, así como el correspondiente a 2026. Para ello, ha sido necesaria la adquisición del caserío situado en el acceso de entrada, paso previo a la ejecución de la obra. Estas actuaciones han permitido acreditar la ejecución presupuestaria de ambos ejercicios.

Actuación 6. Accesibilidad Erisono

D1. Modernización industrial y recuperación de suelo y edificaciones industriales

Ubicación Eibar **Entidad responsable** Gobierno Vasco **Plazo temporal** 2026-2028 **Estado** En ejecución

Descripción

Búsqueda de nuevas alternativas para el acceso a esta nueva fase del Parke.

Presupuesto de la actuación

Importe total	1.250.000,00 €
Importe ZAP	840.000,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	840.000,00 €	840.000,00 €	0,00 €	840.000,00 €

Descripción de los avances

La actuación se encuentra en ejecución, con la dotación prevista en el ejercicio 2026 según la planificación presupuestaria.

Actuación 7. Nuevo acceso hospital/polígonos

D1. Modernización industrial y recuperación de suelo y edificaciones industriales

Ubicación	Varios municipios	Entidad responsable	Diputación Foral de Gipuzkoa	Plazo temporal	2025-2030	Estado	Sin empezar
-----------	-------------------	---------------------	------------------------------	----------------	-----------	--------	-------------

Descripción	Objetivos e impacto esperado
Construcción de un nuevo acceso entre la vía N-634 y el Hospital de Mendaro.	Se trata de un proyecto esencial para para mejorar la comunicación del Hospital Comarcal de Debarrena y de los polígonos industriales de la margen derecha del río Deba.

Presupuesto de la actuación	
Importe total	10.000.000,00 €
Importe ZAP	10.000.000,00 €

Presupuesto ZAP				
Diputación Foral de Gipuzkoa	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
	10.000.000,00 €	12.423.998,00 €	0,00 €	12.423.998,00 €

Descripción de los avances
Redacción del proyecto constructivo.

Actuación 8. Mejora del acceso al Polígono Industrial de Itziar-Deba (GI-3210)

D1. Modernización industrial y recuperación de suelo y edificaciones industriales

Ubicación	Deba	Entidad responsable	Diputación Foral de Gipuzkoa	Plazo temporal	2025-2025	Estado	Ejecutado
-----------	------	---------------------	------------------------------	----------------	-----------	--------	-----------

Descripción	Objetivos e impacto esperado
Renovación de la curva situada frente al Hotel Kanala, GI-3210.	Mejorar la accesibilidad y la seguridad, de los camiones que transportan piezas de gran tamaño, al polígono industrial de Itziar-Deba.

Presupuesto de la actuación	
Importe total	2.026.868,00 €
Importe ZAP	2.026.868,00 €

Presupuesto ZAP				
Diputación Foral de Gipuzkoa	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
	2.026.868,00 €	2.026.868,00 €	2.026.868,00 €	0,00 €

Descripción de los avances
La actuación está finalizada.

Actuación 9. Espacio de datos para PYMES industriales de Bizkaia

D1. Modernización industrial y recuperación de suelo y edificaciones industriales

Ubicación	Ermua	Entidad responsable	Diputación Foral de Bizkaia	Entidad colaboradora	Ayuntamiento de Ermua Fundación Izarra	Plazo temporal	2025-2026	Estado	En ejecución
-----------	-------	---------------------	-----------------------------	----------------------	---	----------------	-----------	--------	--------------

Descripción	Objetivos e impacto esperado
El proyecto “Espacio de datos para PYMES industriales de Bizkaia” que el Ayuntamiento de Ermua-Ermuko Udala y la Fundación Izarra Center van a llevar a cabo con la ayuda a la Diputación Foral de Bizkaia, consiste en crear una infraestructura digital compartida, interoperable y segura que sirva como habilitadora para la economía del dato en el ecosistema productivo del entorno de Ermua. Este proyecto está concebido para superar las barreras tecnológicas, organizativas y jurídicas que enfrentan las empresas, especialmente PYMES, para acceder a capacidades avanzadas de gestión, análisis y explotación estratégica de datos.	Se definen los siguientes objetivos específicos: 1. Dotar al ecosistema industrial de una infraestructura compartida basada en estándares abiertos (como los de IDSA y GAIA-X) que permita la interoperabilidad entre los sistemas de las diferentes empresas. 2. Establecer un modelo de gobernanza federado y estructurado que regule de forma transparente los roles, derechos, obligaciones y licencias de uso de los datos. 3. Fomentar el desarrollo de casos de uso colaborativos, que generen valor compartido a partir de la explotación de datos industriales en retos estratégicos. 4. Incorporar e integrar tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, analítica avanzada o gemelos digitales. 5. Sensibilizar, formar y apoyar a las empresas del tejido industrial, con especial atención a las pymes, para que adquieran capacidades prácticas en gestión de datos, ciberseguridad y adaptación normativa, reduciendo así las barreras de conocimiento. 6. Promover un modelo replicable y escalable, de modo que el nodo de Ermua pueda conectarse en el futuro con otros espacios de datos regionales, nacionales o europeos, ampliando las oportunidades de innovación colaborativa.

Presupuesto de la actuación	
Importe total	467.500,00 €
Importe ZAP	467.500,00 €

Presupuesto ZAP	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Diputación Foral de Bizkaia	467.500,00 €	467.500,00 €	345.500,00 €	122.000,00 €

D2.

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: SECTOR TURÍSTICO Y COMERCIAL

Descripción de los avances

D2. DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: SECTOR TURÍSTICO Y COMERCIAL



Proyectos y actuaciones		Presupuesto ZAP					
		Previsto	Actualizado	Ejecutado		Pendiente	
1	Made in Eibar.	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 %	1.000.000,00 €	100,00 %
2	Plaza del mercado de Errebal.	1.063.000,00 €	1.063.000,00 €	0,00 €	0,00 %	1.063.000,00 €	100,00 %
TOTAL		2.063.000,00 €	2.063.000,00 €	0,00 €	0,00 %	2.063.000,00 €	100,00 %

Actuación 1. Made in Eibar

D2. Diversificación económica: sector turístico y comercial



Ubicación	Eibar	Entidad responsable	Gobierno Vasco	Plazo temporal	2025-2027	Estado	En ejecución
-----------	-------	---------------------	----------------	----------------	-----------	--------	--------------

Descripción
Creación de un proyecto turístico integral. El proyecto ha detectado importantes oportunidades en construir diversos productos turísticos desde el industrial, eventos singulares, el diseño industrial y el cultural a fin de convertir a Eibar en un destino turístico. Con ello buscar generar un nuevo nicho de mercado.

Objetivos e impacto esperado
El turismo actuará como elemento de transformación urbana y generara oportunidades laborales y económicas para el municipio en un sector no desarrollado como es el turístico. Ello supone una mejora en el sector servicios. El proyecto se concibe destinado a las personas turistas e indirectamente repercutirá en la ciudadanía eibarresa y en sus empresas, contribuyendo al desarrollo económico de Eibar y su comarca.

Presupuesto de la actuación	
Importe total	1.000.000,00 €
Importe ZAP	1.000.000,00 €

Presupuesto ZAP				
Gobierno Vasco	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €

Descripción de los avances
Acciones ejecutadas: 1. Comunicación y difusión. 2. Productos turísticos y mejora de la accesibilidad a los recursos. 3. Celebrado la Comisión de Seguimiento. La dotación de 300.000 € prevista para el ejercicio 2025 se mantiene dentro del presupuesto pendiente de ejecución. Para facilitar su desarrollo en condiciones adecuadas, se ha solicitado la aplicación de la cláusula de circunstancias sobrevenidas contemplada en los convenios, que permite prorrogar el plazo de ejecución. Dicha solicitud ha sido aprobada por la Comisión de Seguimiento. En este momento, el importe queda pendiente de asignación a una anualidad concreta, una vez se determine la planificación definitiva de su ejecución. La actuación se está canalizando mediante una subvención nominativa a través de convenio.

Actuación 2. Plaza del Mercado Errebal

D2. Diversificación económica: sector turístico y comercial



Presupuesto de la actuación

Importe total	1.063.000,00 €
Importe ZAP	1.063.000,00 €

Descripción de los avances

Acciones ejecutadas:

1. Digitalización: <https://erosieibarren.eus/>
2. Errebal espacio comercial y otros espacios.
3. Se ha celebrado la Comisión de Seguimiento.

La dotación de 300.000 € prevista para el ejercicio 2025 se encuentra dentro del presupuesto pendiente de ejecución. Para poder desarrollar el convenio en las condiciones adecuadas, se ha solicitado la aplicación de la cláusula de circunstancias sobrevenidas contenida en el convenio, que permite ampliar el plazo de ejecución. Esta petición ha sido aceptada por la Comisión de Seguimiento. En ese momento, el importe queda pendiente de asignar a un ejercicio concreto, una vez determinada la planificación definitiva de su ejecución.

La actuación se está tramitando a través de una subvención nominativa, vía convenio.

Ubicación	Eibar	Entidad responsable	Gobierno Vasco	Plazo temporal	2025-2027	Estado	En ejecución
-----------	-------	---------------------	----------------	----------------	-----------	--------	--------------

Descripción

Se trata estudiar y poner en marcha nuevos modelos de compra. En concreto, la adecuación y dinamización del espacio actual ERREBAL PLAZA, a fin de potenciar la principal zona comercial de Eibar, como en reforzar el ámbito digital.

Objetivos e impacto esperado

El objetivo general es potenciar el entorno de la zona de Errebal y reforzar la plataforma (<https://erosieibarren.eus/>) para fortalecer el sector comercial eibarrés, mejorar la competitividad del tejido comercial, hostelero y de servicios eibarrés y fomentar y facilitar nuevas formas de consumo entre la ciudadanía local.

Presupuesto ZAP


	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	1.063.000,00 €	1.063.000,00 €	0,00 €	1.063.000,00 €

D3.

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: SECTOR CULTURAL

Descripción de los avances

D3. DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: SECTOR CULTURAL



Proyectos y actuaciones		Presupuesto ZAP					
		Previsto	Actualizado	Ejecutado		Pendiente	
1	Equipamiento cultural con visión comarcal.	1.062.000,00 €	1.062.000,00 €	1.062.000,00 €	100,00 %	0,00 €	0,00 %
2	Museo de la Armería.	2.750.000,00 €	2.750.000,00 €	0,00 €	0,00 %	2.750.000,00 €	100,00 %
TOTAL		3.812.000,00 €	3.812.000,00 €	1.062.000,00 €	27,86 %	2.750.000,00 €	72,14 %

Actuación 1. Equipamiento cultural con visión comarcal

D3. Diversificación económica: sector cultural

Ubicación Deba **Entidad responsable** Gobierno Vasco **Plazo temporal** 2025-2025 **Estado** Ejecutado

Descripción

Adquisición del antiguo cine de Deba para nuevo equipamiento cultural con visión comarcal en el municipio.

Presupuesto de la actuación

Importe total	1.062.000,00 €
Importe ZAP	1.062.000,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	1.062.000,00 €	1.062.000,00 €	1.062.000,00 €	0,00 €

Descripción de los avances

Acciones ejecutadas en 2025: Compra del edificio.
A partir de ahora es el Ayuntamiento de Deba quien se encargará de la adecuación del equipamiento y de su puesta en funcionamiento.

Actuación 2. Museo de la armería

D3. Diversificación económica: sector cultural

Ubicación

Eibar

Entidad responsable

Gobierno Vasco

Plazo temporal

2025-2028

Estado

En ejecución

Descripción	Objetivo e impacto esperado
Actualizar el enfoque del museo dotándolo de mayor valor añadido tanto en sus colecciones como en el espacio en que se ubica. Para ello, se plantea una nueva ubicación que impulse la visibilidad y presencia del Museo y sus colecciones.	Impulsar una mayor visibilidad a las colecciones del Museo de la armería, dotándolo de un espacio más adecuado para su uso y objetivo.

Presupuesto de la actuación	
Importe total	9.000.000,00 €
Importe ZAP	2.750.000,00 €

Presupuesto ZAP				
Gobierno Vasco	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
	2.750.000,00 €	2.750.000,00 €	200.000,00 €	2.550.000,00 €


Descripción de los avances
Acciones ejecutadas: 1. En negociaciones con el Corte Inglés para comprar una parte del edificio. 2. Redacción del proyecto Museológico y Museográfico.

D4.

EMPLEO Y PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Descripción de los avances

D4. EMPLEO Y PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL



Proyectos y actuaciones		Presupuesto ZAP					
		Previsto	Actualizado	Ejecutado		Pendiente	
1	Acuicultura.	525.000,00 €	525.000,00 €	0,00 €	0,00 %	525.000,00 €	100,00 %
2	IMH campus.	387.500,00 €	387.500,00 €	0,00 €	0,00 %	387.500,00 €	100,00 %
3	Armeria Eskola – Centro comarcal de referencia y excelencia en Tecnologías Robóticas e Inteligentes (TRel).	950.000,00 €	950.000,00 €	46.839,75 €	4,93 %	903.160,25 €	95,07 %
TOTAL		1.862.500,00 €	1.862.500,00 €	46.839,75 €	2,51 %	1.815.660,25 €	97,49 %

Actuación 1. Acuicultura

D4. Empleo y proyectos de formación profesional



Ubicación	Mutriku	Entidad responsable	Gobierno Vasco	Plazo temporal	2025-2027	Estado	En ejecución
-----------	---------	---------------------	----------------	----------------	-----------	--------	--------------

Descripción

Paso previo al proyecto integral de mejora de las instalaciones y vinculación con la generación de actividad económica de Centro de Formación Profesional: reparación del talud que afecta al centro de Kardala, actuación cofinanciada y a organizar con el Ayuntamiento de Mutriku.

Presupuesto de la actuación

Importe total	700.000,00 €
Importe ZAP	525.000,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	525.000,00 €	525.000,00 €	0,00 €	525.000,00 €

Descripción de los avances

- Acciones ejecutadas:
1. Formalización de la Subvención Directa al Ayuntamiento de Mutriku (finales 2025).

La dotación de 525.000 euros prevista inicialmente para el ejercicio 2025 se reprograma al ejercicio 2027, manteniéndose dentro del presupuesto previsto para la actuación.

Actuación 2. IMH Campus

D4. Empleo y proyectos de formación profesional

Ubicación Elgoibar **Entidad responsable** Gobierno Vasco **Plazo temporal** 2025-2026 **Estado** En ejecución

Descripción

Impulso a un centro educativo especializado en la fabricación avanzada y digital, que trabaja en red con alianzas estratégicas locales e internacionales.

Presupuesto de la actuación

Importe total	387.500,00 €
Importe ZAP	387.500,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	387.500,00 €	387.500,00 €	0,00 €	387.500,00 €

Descripción de los avances

Acciones ejecutadas:

- 1. Libramiento realizado a IMH Campus (387.500,00 €).

La dotación de 387.500,00 euros inicialmente prevista para el ejercicio 2025 se incorpora a la planificación presupuestaria del ejercicio 2026 para avanzar en su ejecución.

Actuación 3. Armeria eskola – Centro comarcal de referencia y excelencia en Tecnologías Robóticas e Inteligentes (TREI)

D4. Empleo y proyectos de formación profesional



Ubicación	Eibar	Entidad responsable	Gobierno Vasco	Plazo temporal	2025-2027	Estado	En ejecución
-----------	-------	---------------------	----------------	----------------	-----------	--------	--------------

Descripción

Adquisición de equipamiento, formación al profesorado y asistencia de expertos en temáticas destacadas.

Presupuesto de la actuación

Importe total	950.000,00 €
Importe ZAP	950.000,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	950.000,00 €	950.000,00 €	46.839,75 €	903.160,25 €

Descripción de los avances

- Acciones ejecutadas:
1. Libramiento realizado (175.000 €).
 2. Compra de equipamiento y compra de fungibles.


La dotación de 128.160,25 euros prevista inicialmente para 2025 se incorpora a la planificación presupuestaria del ejercicio 2026 para su ejecución.

D5.

REGENERACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN SOCIAL

Descripción de los avances

D5. REGENERACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN SOCIAL



Proyectos y actuaciones	Presupuesto ZAP					
	Previsto	Actualizado	Ejecutado		Pendiente	
1 Regeneración zona Olalde.	3.375.000,00 €	3.375.000,00 €	112.500,00 €	3,33 %	3.262.500,00 €	96,67 %
2 Rehabilitación plaza del mercado de Ermua.	1.125.000,00 €	1.119.750,00 €	0,00 €	0,00 %	1.119.750,00 €	100,00 %
3 Recuperación de la plaza de Usetxe y reconstrucción del edificio para equipamiento cultural.	1.800.000,00 €	1.802.829,78 €	5.829,78 €	0,32 %	1.797.000,00 €	99,68 %
4 Edificio Larrañaga y Elorza.	1.000.000,00 €	985.949,48 €	425.949,48 €	42,20 %	560.000,00 €	56,80 %
5 Edificio Ugartetxea.	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	100,0 %	0,00 €	0,00 %
6 Nuevos equipamiento servicios sociales.	23.202.514,00 €	23.202.514,00 €	0,00 €	0,00 %	23.202.514,00 €	100,00 %
TOTAL	31.502.514,00 €	31.486.043,25 €	1.544.279,25 €	4,90 %	29.941.764,00 €	95,10 %

Actuación 1. Regeneración zona Olalde

D5. Regeneración urbana y protección social



Ubicación Soraluze **Entidad responsable** Gobierno Vasco **Plazo temporal** 2025-2027 **Estado de la situación** En ejecución

Descripción
Proyecto tractor de regeneración urbanística, económica y social de una zona ubicada en el casco urbano del municipio. Se pretende llevar a cabo la regeneración urbana global de la Zona de Olalde y Casco Viejo de Soraluze, poniendo fin a la actual situación de abandono de la zona, creando un nuevo espacio urbano y privado en condiciones adecuadas para el uso público. El objetivo general está estrechamente relacionado con la necesidad de dotar de mayor accesibilidad al centro urbano desde la zona sur. Se conseguirá, además, un espacio libre de ribera urbana. En definitiva, se trata del desarrollo del ámbito de Olalde.

Objetivos e impacto esperado
Olalde es hoy un espacio formado por edificios obsoletos y sin actividad, parte de los cuales son propiedad del Ayuntamiento. Para completar la actuación será necesaria la adquisición de propiedades no municipales en el área, el desarrollo del Planeamiento (PAU y proyecto de urbanización), la descontaminación de suelos potencialmente contaminados y la ejecución de obras de urbanización del ámbito que incluyen, entre otras, la ejecución del nuevo puente peatonal sobre el río Deba y el ascensor que conectará el barrio de Zeleta con el centro. Con esta reordenación de Olalde se prevé la integración activa y positiva del río mediante:
Se busca mejorar las condiciones de accesibilidad de Soraluze, mejorando las márgenes del río, dando una prolongación al núcleo urbano y sustituyendo edificios industriales obsoletos por nuevas viviendas, mejorando la calidad de vida del centro de Soraluze.

Presupuesto de la actuación

Importe total	4.500.000,00 €
Importe ZAP	3.375.000,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	3.375.000,00 €	3.374.999,99 €	112.499,99 €	3.262.500,00 €

Descripción de los avances

- Acciones ejecutadas:
1. Proyecto de Obra de DEMOLICIÓN DE KALEBARREN 24 Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO (25%).

Con fecha de 11 de noviembre de 2025, el Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas presenta una nueva solicitud en la que indica que las dificultades administrativas y causas sobrevenidas que se exponen a continuación van a retrasar la ejecución de las actuaciones. Ante todo lo anterior, se solicita desde el Ayuntamiento la siguiente reprogramación de anualidades para concluir adecuadamente la ejecución y, así mismo, para la presentación de documentación justificativa. Se procede a recoger en la propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno las modificaciones planteadas por el Ayuntamiento en su última solicitud de cara a poder proceder con la tramitación del expediente.

Actuación 2. Rehabilitación Plaza del Mercado de Ermua

D5. Regeneración urbana y protección social



Presupuesto de la actuación

Importe total	1.500.000,00 €
Importe ZAP	1.125.000,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	1.125.000,00 €	1.119.750,00 €	0,00 €	1.119.750,00 €

Descripción de los avances

Acciones ejecutadas:

1. Licitación para la redacción del proyecto básico y ejecutivo. La licitación para la contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución se ha adjudicado el 2026/01/15. Adjudicatario: I. INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL.

La anualidad de 5.250,00 euros prevista para el ejercicio 2025 no se incorpora finalmente al presupuesto ejecutado de la actuación, al no haberse completado su justificación dentro del ejercicio correspondiente.

Ubicación Ermua Entidad responsable Gobierno Vasco Plazo temporal 2025-2027 Estado En ejecución

Descripción

Revisión de su uso y acondicionamiento del edificio.

El edificio objeto de la propuesta se sitúa en un enclave estratégico dentro del municipio, hecho que dota a este espacio de gran potencial de dinamización social y cultural del entorno.

El diseño y organización espacial original no responde a la realidad de la actividad comercial de escala local actual, la cual, con el paso de los años ha disminuido, conllevando una paulatina desocupación de los puestos del mercado. Ante esta situación, se ve como una oportunidad estratégica el poder rehabilitar este edificio y dotarlo de nuevos usos que puedan dar respuesta a las demandas actuales de la ciudadanía.

Objetivos e impacto esperado

Rehabilitar el edificio, para revitalizar la infraestructura municipal y todo su entorno, convirtiéndolo en un nuevo polo social, cultural y comunitario del municipio. Un nuevo equipamiento readaptado ya condicionado a las nuevas necesidades y criterios ambientales.

Actuación 3. Recuperación de la plaza de Usetxe y reconstrucción del edificio para equipamiento cultural

D5. Regeneración urbana y protección social



Ubicación	Elgoibar	Entidad responsable	Gobierno Vasco	Plazo temporal	2025-2027	Estado	En ejecución
------------------	----------	----------------------------	----------------	-----------------------	-----------	---------------	--------------

Descripción

El proyecto consiste en diseñar y redactar documentación necesaria para la recuperación de la plaza Usetxe y la reconstrucción del edificio para equipamiento cultural, junto con la ejecución de las obras de ambas actuaciones. La zona se ubica junto al río Deba que, actualmente, presenta un estado degradado con aspecto residual. Para ello, se propone la demolición del antiguo edificio de escuelas y la construcción de un nuevo edificio de planta baja semisoterrada de uso cultural y la creación de una plaza abierta al río Deba sobre el edificio soterrado. Además, se prevé, también, la construcción de un edificio soterrado en el desnivel existente entre la plaza Usetxe y el río, el cual albergará espacios para colectivos locales sin ánimo de lucro. Se trata de un proyecto con un alto potencial transformador desde la perspectiva ambiental urbana y social.

Objetivos e impacto esperado

La actuación tiene como objetivo regenerar el entorno de las antiguas escuelas con una propuesta singular y a su vez sencilla, para revitalizar la zona, generar un lugar atractivo, agradable y amable para los vecinos, a la vez que conseguir ser un punto de conexión entre la calle Toletxe y la ribera del río actualmente infrutilizada. Todo ello, tiene como objetivo, también, poner el valor el río Deba, así como crear itinerarios de la ribera ahora poco utilizados.

Presupuesto de la actuación

Importe total	2.400.000,00 €
Importe ZAP	1.800.000,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	1.800.000,00 €	1. 802.829,78 €	5.829,78 €	1.797.000,00€

Descripción de los avances

Acciones ejecutadas:

1. Trabajos previos (topografía, estudio geotécnico, análisis estructural, participación ciudadana, etc.).
2. Redacción de pliegos concurso de ideas.
3. Primera y segunda fase del concurso.

Con fecha 3 de octubre de 2025, el Ayuntamiento de Elgoibar presenta una solicitud de subvención para la recuperación de la Plaza Usetxe y reconstrucción del edificio para equipamiento cultural. Es entonces cuando se concretan los importes anuales de la subvención, con el objetivo de acomodarlos a la realidad de la gestión y tramitación del proyecto. En el ejercicio 2025 se han ejecutado 2.829,78 euros por encima del importe inicialmente previsto, lo que se ha traducido en un aumento del presupuesto actualizado.

Actuación 4. Edificio Larrañaga y Elorza

D5. Regeneración urbana y protección social

UbicaciónEibar

Entidad responsableGobierno Vasco

Plazo temporal2025-2028

EstadoEn ejecución

Descripción

El proyecto tiene por objeto la adquisición, derribo y reurbanización del inmueble, denominado LARRAÑAGA Y ELORZA, sito en el número 13 de la calle Barrena de Eibar. Con el objetivo de regenerar la zona este de Eibar, se contempla la compra del edificio Larrañaga y Elorza, su posterior derribo y la reurbanización de la parcela, para dotar a la zona con espacios libres y aparcamientos, muy deficitarios en la calle Barrena. Tras su adquisición el proyecto contempla el derribo del edificio, habilitando en la parcela un aparcamiento de aproximadamente 80 plazas y junto a la calle Barrena un espacio libre que incorpore vegetación al uso cotidiano de la ciudad.

Objetivos e impacto esperado

Se trata de una actuación de excepcional necesidad para la mejora del barrio, pues se logra eliminar el último edificio industrial abandonado, quedando únicamente edificios equipamentales como el de Telefónica o el de restauración -situado junto a la gasolinera- y el edificio de EVIA, con uso comercialización de utensilios de pesca, servicios, garaje y aparcamientos (compatibles con el uso residencial). La generación de un espacio libre a pie de calle en la antigua parcela de Larrañaga y Elorza, que incorpore vegetación, contribuirá de forma significativa a la transición verde de la ciudad.

Presupuesto de la actuación

Importe total	1.250.000,00 €
Importe ZAP	1.000.000,00 €

Presupuesto ZAP

Gobierno Vasco	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
	1.000.000,00 €	985.949,48 €	425.949,48 €	560.000,00€

Descripción de los avances

- Acciones ejecutadas:
1. Compraventa del inmueble y registro en el Registro de la Propiedad.

Actuación 5. Edificio Ugartetxea

D5. Regeneración urbana y protección social

Ubicación	Eibar	Entidad responsable	Gobierno Vasco	Plazo temporal	2025-2025	Estado de la situación	Ejecutado
-----------	-------	---------------------	----------------	----------------	-----------	------------------------	-----------

Descripción	Objetivos e impacto esperado
El proyecto consiste en la adquisición del inmueble, denominado UGARTETXEA, sito en el número 32 de la calle Txonta de Eibar. Por parte del Ayuntamiento de Eibar, se encuentra trabajando en la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (aprobada provisionalmente por el Pleno en mayo de 2025) para permitir la ejecución de un importante proyecto: la construcción de 200 viviendas protegidas en el barrio de Txonta, conveniadas ya con la Consejería de Vivienda y Agenda Urbana.	El objetivo es la adquisición del inmueble para su transformación en un edificio de aparcamientos que albergue las plazas anexas a la vivienda protegida a construir, lo que contribuye indudablemente a la sostenibilidad económica de la operación sin olvidar su vertiente medioambiental, al transformar un edificio vacío y darle, por fin, una vida ya que, desde su construcción hace varias décadas nunca ha sido utilizado.

Presupuesto de la actuación	
Importe total	1.250.000,00 €
Importe ZAP	1.000.000,00 €

Presupuesto ZAP				
Gobierno Vasco	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00€

Descripción de los avances
Acciones ejecutadas: 1. Compraventa. 2. Inscripción en el Registro de la Propiedad.

Actuación 6. Nuevo equipamiento servicios sociales

D5. Regeneración urbana y protección social

Ubicación	Elgoibar	Entidad responsable	Diputación Foral de Gipuzkoa	Plazo temporal	2025-2027	Estado	En ejecución
-----------	----------	---------------------	------------------------------	----------------	-----------	--------	--------------

Descripción	Objetivos e impacto esperado
La DFG ha formalizado con el Ayuntamiento de Elgoibar un contrato mixto de concesión de obra y ejecución de un aparcamiento para la construcción de un equipamiento de Servicios Sociales en el área "6-E- EL PILAR" de Elgoibar.	El objetivo es disponer de servicios sociales y cuidados para la tercera edad, dentro de la comarca del bajo Deba.

Presupuesto de la actuación

Importe total	23.202.514,00 €
Importe ZAP	23.202.514,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Diputación Foral de Gipuzkoa	23.202.514,00 €	23.202.514,00 €	0,00 €	23.202.514,00 €

Descripción de los avances

Actuaciones ejecutadas:

- 1. Inicio de la obra en julio de 2025.
- 2. Trabajos de excavación.


El proyecto será ejecutado por la UTE Elgoibar, formada por Viuda de Sainz y Beharko, adjudicataria tanto de la construcción como de la gestión del centro por un periodo de 10 años. A cambio, la UTE recibirá 88,5 millones de euros, de los que 20,6 millones se destinarán a la ejecución de obra.

D6.

MEDIOAMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Descripción de los avances

D6. MEDIOAMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE



Proyectos y actuaciones		Presupuesto ZAP					
		Previsto	Actualizado	Ejecutado		Pendiente	
1	Estuario de Mutriku - Deba.	1.000.000,00 €	850.000,00 €	0,00 €	0,00 %	850.000,00 €	100,00 %
2	Ascensor de Urruzuno.	617.119,00 €	1.964.287,81 €	0,00 €	0,00 %	1.964.287,81 €	100,00 %
3	Accesibilidad Polígono Arriaga.	3.104.109,00 €	3.104.109,00 €	0,00 €	0,00 %	3.104.109,00 €	100,00 %
4	Ascensores Barakaldo.	782.881,00 €	1.515.608,04 €	1.515.608,04 €	100,00 %	0,00 €	0,00 %
5	Ascensor Torrekua.	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 %	700.000,00 €	100,00 %
6	Reordenación de las intersecciones de la BI-2301 en Mallabia.	3.970.000,00 €	3.970.000,00 €	3.275.650,80 €	82,51 %	694.349,20 €	17,49 %
7	Variante oeste de Ermua.	71.800.000,00 €	71.800.000,00 €	2.747.014,63 €	3,83 %	69.052.985,37 €	96,17 %
8	Bidegorri conexión Gipuzkoa.	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	0,00 €	0,00 %	1.070.000,00 €	100,00 %
9	Mejora del puente de acceso a Merando GI-3821.	3.254.520,00 €	3.254.520,00 €	3.254.520,00 €	100,00 %	0,00 €	0,00 %
TOTAL		86.298.629,00 €	88.228.524,85 €	10.792.793,47 €	12,23 %	77.435.731,38 €	87,77 %

Actuación 1. Estuario de Mutriku - Deba

D6. Medio ambiente y movilidad sostenible

Ubicación Mutriku y Deba **Entidad responsable** Gobierno Vasco **Plazo temporal** 2025-2029 **Estado** Sin empezar

Descripción

La actuación consiste en la restauración del entorno del polígono industrial, actualmente degradado, mediante intervenciones orientadas a su recuperación y mejora, tanto desde el punto de vista paisajístico como ambiental.

Entre las posibles acciones pueden estar: Restauración de hábitats de marisma y mejora de conectividad de los espacios naturales del entorno del estuario interior de la ría del Deba, estudio de itinerarios de conexión para las bicicletas y peatones por las márgenes del estuario, y renaturalización, rehabilitación y mejora de las marismas y el río Deba.

Presupuesto de la actuación

Importe total	1.000.000,00 €
Importe ZAP	1.000.000,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	850.000,00€

Descripción de los avances

Durante el ejercicio 2026 se prevé avanzar, junto con la Diputación y ambos ayuntamientos, en la definición del proyecto y en la delimitación de sus objetivos. La ejecución se iniciará a partir de 2027, de acuerdo con la planificación presupuestaria prevista para los ejercicios 2027 y 2028.

Actuación 2. Ascensor de Urruzuno

D6. Medio ambiente y movilidad sostenible

Ubicación Elgoibar **Entidad responsable** Gobierno Vasco **Plazo temporal** 2026-2027 **Estado** En ejecución

Descripción

Instalación de un ascensor y pasarela de acceso sobre las vías del tren, que nace desde la calle Toletxe y desembarca en el parque Urruzuno.

Presupuesto de la actuación

Importe total	621.419,00 €
Importe ZAP	617.119,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	617.119,00 €	1.964.287,81 €	0,00 €	1.964.287,81 €

Descripción de los avances

- Acciones ejecutadas:
- 1. Redacción del proyecto constructivo.
 - 2. Firma del Convenio con el Ayuntamiento de Elgoibar.

El presupuesto inicial previsto se ha incrementado en 1.347.168,81 euros, debido a la incorporación de recursos propios del departamento responsable, que permiten ampliar la dotación planificada para 2026 e incluir una nueva partida presupuestaria en 2027, no prevista inicialmente.

Actuación 3. Accesibilidad polígono Arriaga

D6. Medio ambiente y movilidad sostenible

Ubicación Elgoibar **Entidad responsable** Gobierno Vasco **Plazo temporal** 2025-2029 **Estado** En ejecución

Descripción

Nuevo acceso al polígono Arriaga y ampliación de la plataforma del tren para un futuro bidegorri, con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Elgoibar.

Presupuesto de la actuación

Importe total	3.104.109,00 €
Importe ZAP	3.104.109,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	3.104.109,00 €	3.104.109,00 €	0,00 €	3.104.109,00 €

Descripción de los avances

- Acciones ejecutadas:
- 1. Redacción del proyecto constructivo.
 - 2. Firma del Convenio con el Ayuntamiento de Elgoibar.

Actuación 4. Ascensores Barakaldo

D6. Medio ambiente y movilidad sostenible

Ubicación Eibar **Entidad responsable** Gobierno Vasco **Plazo temporal** 2025-2025 **Estado de la situación** Ejecutado

Descripción

Construcción de un ascensor para la unión del paso sobre las vías del tren.

Presupuesto de la actuación

Importe total	782.881,00 €
Importe ZAP	782.881,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	782.881,00 €	1.515.608,04 €	1.515.608,04 €	0,00 €

Descripción de los avances

- Acciones ejecutadas:
1. Ejecución del proyecto y la obra.

La actuación se ha finalizado con una ejecución total superior en 732.727,04 euros al importe inicialmente previsto. Esta diferencia ha sido asumida con recursos propios del departamento responsable de la actuación. Asimismo, en el ejercicio 2025 se ha ejecutado la dotación presupuestaria correspondiente a las anualidades 2025 y 2026.

Actuación 5. Ascensor Torrekua

D6. Medio ambiente y movilidad sostenible

Ubicación

Eibar

Entidad responsable

Gobierno Vasco

Plazo temporal

2027-2028

Estado

En ejecución

Descripción

Construcción de un ascensor para la unión de Torrekua con Berdintasun pasalekua.

Presupuesto de la actuación

Importe total	700.000,00 €
Importe ZAP	700.000,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Gobierno Vasco	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €

Descripción de los avances

Acciones ejecutadas:

1.

Redacción del proyecto.

2.

Actualización del proyecto constructivo.

Actuación 6. Reordenación de las intersecciones de la BI-2301 en Mallabia

D6. Medio ambiente y movilidad sostenible

Ubicación	Mallabia	Entidad responsable	Diputación Foral de Bizkaia	Plazo temporal	2025-2026	Estado	Ejecutado
-----------	----------	---------------------	-----------------------------	----------------	-----------	--------	-----------

Descripción	Objetivos e impacto esperado
Mejora de la seguridad vial entre los puntos kilométricos 43+500 y 44+100 de la carretera BI-2301 en Mallabia. Contempla mejoras en la intersección de acceso al polígono industrial de Goitondo.	El objetivo principal es mejorar la seguridad vial del tramo. Con la actuación se conseguirá mejorar la accesibilidad al polígono y los barrios, además de mejorar la permeabilidad peatonal tanto a los establecimientos del entorno, a barrios, como a las paradas de transporte publico de trabajadores del propio polígono, entre otros.

Presupuesto de la actuación	
Importe total	3.970.000,00 €
Importe ZAP	3.970.000,00 €

Presupuesto ZAP				
	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Diputación Foral de Bizkaia	3.970.000,00 €	3.970.000,00 €	3.970.000,00 €	0,00 €

Descripción de los avances
Durante el ejercicio 2025 se ha ejecutado la dotación presupuestaria prevista para dicha anualidad. Asimismo, en este momento ya se ha abonado la certificación final de la actuación, lo que ha supuesto la ejecución anticipada de la partida prevista para 2026.

Actuación 7. Variante oeste de Ermua

D6. Medio ambiente y movilidad sostenible

Ubicación	Ermua	Entidad responsable	Diputación Foral de Bizkaia	Entidad colaboradora	Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.	Plazo temporal	2025-2029	Estado	En ejecución
-----------	-------	---------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------	-----------	--------	--------------

Descripción	Objetivos e impacto esperado
Se trata de una variante de población al núcleo urbano de Ermua, localizada a su oeste, que viene motivada por la necesidad de aliviar de tráfico en el centro del municipio; principalmente, eliminando el paso de los vehículos pesados que se originan en los polígonos industriales cercanos. Se desarrollará en dos fases consecutivas: 2026-2029 y 2029-2032.	La actuación mejorará la calidad de vida de los habitantes del municipio, reduciendo la contaminación por gases y ruidos, aumentando la seguridad viaria y permitiendo hacer actuaciones que conviertan las calles en zonas más amigables para el peatón. Asimismo, reducirá el tiempo de viaje de los vehículos, que ya no tendrán que pasar por zonas congestionadas, lo que derivará en una separación de los flujos de tráfico de los flujos peatonales y ciclistas.

Presupuesto de la actuación	
Importe total	71.800.000,00 €
Importe ZAP	71.800.000,00 €

Presupuesto ZAP				
	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
Diputación Foral de Bizkaia	71.800.000,00 €	71.800.000,00 €	2.747.014,63 €	69.052.985,37 €

Descripción de los avances
Acciones ejecutadas: - Aprobación del proyecto de construcción de la primera fase, denominada “Urtia”. - En redacción el proyecto de construcción de la segunda fase, denominada “Mallumendi”. .

Actuación 8. Bidegorri - conexión Gipuzkoa

D6. Medio ambiente y movilidad sostenible

Ubicación	Zaldibar y Ermua	Entidad responsable	Diputación Foral de Bizkaia	Entidad colaboradora	Ayuntamiento de Zaldibar	Plazo temporal	2025 -2029	Estado	Sin empezar
-----------	------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	------------	--------	-------------

Descripción	Objetivos e impacto esperado
Actuación de conexión con Gipuzkoa sobre la BI-3344: tramo Olarreaga-Sallobente.	Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaldibar y la D.F.B para la construcción de una acera-bici, por parte del Ayuntamiento, comunicando los términos municipales de Zaldibar, Ermua y Eibar. Es una zona muy concurrida por peatones que transitan desde Zaldibar a Eibar, atravesando esta zona industrial. Se mejorará la permeabilidad peatonal y la seguridad vial de estos usuarios vulnerables. Facilitando además unos modos de desplazamiento mas sostenibles, como alternativa al vehículo privado.

Presupuesto de la actuación	
Importe total	1.070.000,00 €
Importe ZAP	1.070.000,00 €

Presupuesto ZAP				
Diputación Foral de Bizkaia	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	0,00 €	1.070.000,00 €

Descripción de los avances
Acciones ejecutadas: 1. Firma de un Convenio de Colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Zaldibar.

Actuación 9. Mejora del puente de acceso a Mendaro GI-3821

D6. Medio ambiente y movilidad sostenible

Ubicación	Mendaro	Entidad responsable	Diputación Foral de Gipuzkoa	Plazo temporal	2025-2025	Estado	Ejecutado
-----------	---------	---------------------	------------------------------	----------------	-----------	--------	-----------

Descripción

Mejora y ampliación estructural del viaducto, incluyendo las aceras peatonales.

Presupuesto de la actuación	
Importe total	3.254.520,00 €
Importe ZAP	3.254.520,00 €

Presupuesto ZAP				
Diputación Foral de Gipuzkoa	Importe inicial previsto	Importe actualizado	Ejecutado	Pendiente
	3.254.520,00 €	3.254.520,00 €	3.254.520,00 €	0,00 €

Descripción de los avances

Actuación finalizada.

Nuevos proyectos y actuaciones

Plan Estratégico Comarcal_PEC
Debabarrena

D4.

EMPLEO Y PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Descripción de los avances

Campus fabricación avanzada (IMH)

D4. Empleo y proyectos de formación profesional

Ubicación	Elgoibar	Entidad responsable	Diputación Foral de Gipuzkoa	Entidad colaboradora	AFM (Advanced Manufacturing Technologies) IMH Campus	Plazo temporal	2026-2026	Estado	En ejecución
-----------	----------	---------------------	------------------------------	----------------------	---	----------------	-----------	--------	--------------

Descripción	Objetivo e impacto esperado
El Campus, situado en las instalaciones del IMH de Elgoibar, se completará con una infraestructura dotada de la más novedosa tecnología en robótica de precisión pensada para la fabricación. Este nuevo da continuidad a la apuesta que la Diputación ha realizado a lo largo de los años en el IMH, que se materializa en diversos laboratorios conectados y sinérgicos (Manufacturing, Digitalización, Robótica, Fabricación Aditiva y Diseño) concebidos para la formación avanzada en un entorno industrial real y también para la demostración, desarrollo, prueba, y validación de soluciones industriales.	Este espacio impulsará la colaboración abierta entre empresas, con el potente ecosistema de centros tecnológicos, universidades y formación profesional, contribuyendo a fortalecer la competitividad del tejido industrial.

Presupuesto de la actuación

Importe	1.250.000,00 €
---------	----------------

Presupuesto

	Importe	Ejecutado	Pendiente
Diputación Foral de Gipuzkoa	1.250.000,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €

Descripción de los avances

- Acciones ejecutadas:
1. Puesta en marcha del laboratorio de robótica (en curso).

D6.

MEDIOAMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Bidegorri Elgoibar-Mendaro: tramo-Altzola Mendaro

D6. Medio ambiente y movilidad sostenible

Ubicación	Elgoibar y Mendaro	Entidad responsable	Diputación Foral de Gipuzkoa	Plazo temporal	2025-2028	Estado	En ejecución
-----------	--------------------	---------------------	------------------------------	----------------	-----------	--------	--------------

Descripción	Objetivo e impacto esperado
Construcción de bidegorri e itinerario peatonal entre Elgoibar y Mendaro. Tramo Altzola Mendaro, junto a la carretera N-634.	Garantizar la conexión peatonal y del bidegorri entre los dos municipios, que de seguridad tanto a los tránsitos peatonales como en bicicleta.

Presupuesto de la actuación

Importe 3.560.000,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe	Ejecutado	Pendiente
Diputación Foral de Gipuzkoa	3.560.000,00 €	0,00 €	3.560.000,00 €

Descripción de los avances

- Acciones ejecutadas:
1. Licitación para la redacción del proyecto constructivo.

Mejora y seguridad en infraestructuras para la movilidad

D6. Medio ambiente y movilidad sostenible

Ubicación	Escala comarcal	Entidad responsable	Diputación Foral de Gipuzkoa	Plazo temporal	2026-2026	Estado	En ejecución
-----------	-----------------	---------------------	------------------------------	----------------	-----------	--------	--------------

Descripción

Mejora, adecuación y seguridad vial en paradas de transporte público ubicadas junto a infraestructuras viarias de la red Foral.

Objetivo e impacto esperado

Mejorar la seguridad vial y para las personas usuarias en paradas de transporte público.

Presupuesto de la actuación

Importe 340.763,00 €

Presupuesto ZAP

	Importe	Ejecutado total	Pendiente total
Diputación Foral de Gipuzkoa	340.763,00 €	0,00 €	340.763,00 €

Descripción de los avances

- Acciones ejecutadas:
1. Elgoibar: parada de autobús Arriaga N-634. Ejecución de mejoras.
 2. Mendaro: parada de autobús N-634.

Plan Estratégico Comarcal Debebarrena

Informe de seguimiento, abril 2026
